
## Panel Tray外觀瑕疵檢測

### 驗收內容定義

| 驗收項目                   | 內容   | 驗收條件   | 備註   | 9/                          |
|------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| 1. 設備裝機                | <ul><li>光學設備</li><li>。 含CCD &amp; 光源架設</li><li>控制感測器</li><li>・ 判斷進板時機</li><li>自動化標記機構</li><li>・ 自動化標記</li></ul>  | 由KS人員驗收,裝機完成                                   | • 需鎖附鎖附固定(需請奕陞確認   | 0                           |
| 2. 瑕疵檢測模型              | 環疵規格定義 ・ 産品: ABF Tray ・ 驗收瑕疵種類 (3種): 破損、刮傷、殘膠 ・ 不列入驗收瑕疵種類: 其他類  瑕疵關切區 ・ 破損: tray 正面全檢 ・ 刮傷、殘膠: 只檢tray內側  驗收指標 ・ 瑕疵可判率 = 模型檢出的瑕疵數/瑕疵總數 ・ 瑕疵準確率 = (模型檢出且分類正確的該類瑕疵數)/(實際該類瑕疵總數) | 指標通過 (5/8 KS已確認)<br>- 可判率 ≥ 90%<br>- 準確率 ≥ 90% | 以瑕疵影像驗證     瑕疵須為肉眼可辨     指標只計算關切區內的瑕疵     由KS提供測試樣本&標註     訓練平台另案處理(含報價) | SALA訓練平台另案處理(for 新瑕疵自行訓練需求) |
| 3. 自動化標記               | 瑕疵檢測結果串接 ・ 検測結果對應正確標記顏色 (可由KS自行設定) ・ 顏色需清晰可辨  耗材更換警示 ・ 耗材不足警示燈提醒  験收指標 ・ Tray可判率 = 正確自動化標記的tray數/tray總數  | 指標通過 (4/25 KS提出)<br>- Tray可判率 ≥ 90%            | • 以線上實機驗證  |                             |
| 4. 資料可視化<br>(5/8 KS新增) | <b>資料上拋MVIX顯示 (內容待KS討論確認)</b> ・ 即時串流畫面 ・ AI檢測結果畫面 ・ 治具Recipe Table & AI Results Table ・ 営前檢測片數 & 営日需報廢片數顯示   | 功能完成   | • 報價請ADT協助更新(5/3 KS拼<br>• 需連接KS內網(需KS確認網點)<br>• 現場是否有螢幕顯示(需KS確認          | , AL                        |

# Panel Tray外觀瑕疵檢測 <sup>資料可視化內容討論</sup>

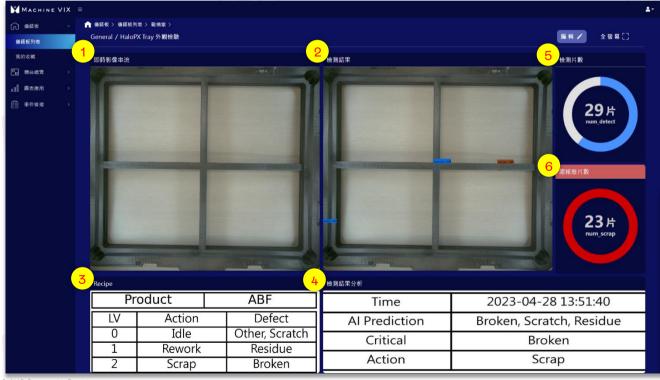

#### 現有可視化功能(待KS討論增減)

- 1. 攝影機即時畫面
- 2. AI檢測結果影像(最近一筆)
- 3. Recipe資訊
- 4. AI檢測結果資訊(最近一筆)
- 5. AI檢測總片數
- 6. AI檢測需報廢總片數

## Panel Tray外觀瑕疵檢測

#### Follow up

- 1. ADT報價更新(含MVIX資料可視化)
- 2. 專案時程規劃
- 3. MVIX資料可視化內容定義 (待KS確認)
- 4. 場域資訊確認 (請KS奕陞協助)
  - ◆ 鎖附施工
  - ◆ 現場有無網點
  - ◆ 現場有無螢幕架設需求



## Tap Into The Possibilities

